

GDN100

Perspectives du management de projet



Perspective du management de projet

©Introduction

Gestion de projet, management de projet, ingénierie séquentielle, ingénierie concourante, méthode Agile, Kanban, Lean, etc, sans que l'on s'en rende toujours compte, le management de projet n'a jamais cessé d'évoluer et de s'enrichir de nouvelles pratiques.

Le management de projet s'adapte à nos modes de vie et à nos modèles de production et de service.

Le management de projet comprends sont lot d'effet négatif, de limite et ses perspectives. C'est cela que nous allons approcher dans ce cours.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 2

Les effets négatifs des projets

© Les effets négatifs des projets

Nous l'avons vu, les projets ont souvent une connotation positive. Ils sont l'évolution, la modernité pour ne pas dire l'avenir. C'est le collectif et le dépassement de soi. La participation de l'individu à quelque chose de plus grand, de plus ambitieux, etc.

Mais arrêtons nous là. Les projets sont aussi des changements organisationnels : ce changement dans un système bien rôdé que tout le monde maîtrise. C'est un travail à réaliser avec des contraintes de délai, de budget, de qualité parfois très importantes. C'est parfois beaucoup d'incertitude sur le comment et la future réussite du résultat. On compte sur nous mais peut-être un peu trop. Et le projet est donc aussi un gros facteur de stress pour l'équipe projet, l'équipe de management, les futurs utilisateurs, etc.

D'autre part, le mode de management de projet, souvent transversal, place temporairement dans l'organisation, un mode de management qui bouleverse la hiérarchie établie. Cela peut générer des conflits, pointer des incompétences, des erreurs de gestion et donc accroître les tensions entre individus dans l'organisation.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 3

Les effets négatifs des projets

© Les effets négatifs des projets

Alain Asquin, Gilles Garel et Thierry Picq (2010) identifie trois type de risques qui découlent du management de projet :

- Les risques individuels liés à l'excès d'implication et d'engagement
- Les risques de déstabilisation des identités professionnelles (lié par exemple à un management transversal temporaire)
- Les risques de précarisation du parcours professionnel (cas par exemple d'un individu qui pour x raisons ne serait jamais affecté à un projet et pourrait-être perçu comme de la non-reconnaissance de ses capacités/compétences)

Les projets sont souvent cruciaux pour les organisations et ils ont une forte connotation positive mais en bonne intelligence, on ne peut ignorer les impacts négatifs qu'ils pourraient y avoir si le management de projet manque de vigilance.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaillo - diapo 4

Les effets négatifs des projets

©La pression des exigences (risque individuel)

Cela n'a pas toujours été le cas et est toujours à éviter pour certain type de projet. Mais avouons que spécialement en mode projet, on nous parle de plus en plus de flexibilité et d'agilité. On crée des événements pour motiver l'équipe. On rapporte les croissants. On blague. Car oui, il est important de créer très vite une cohésion dans l'équipe. Mais pourquoi?

Et bien parce que le mode projet est aussi l'un des plus exigeant pour les ressources. Il faut rendre des comptes tout le temps et sur tout. Allez savoir pourquoi, on pointe toujours l'erreur et beaucoup plus rarement la réussite. En permanence, on mesure l'état d'avancement du projet et par conséquent on vous rappelle en permanence si vous prenez du retard, si vous risquez de retarder vos nouveaux « copains » de l'équipe. Le sentiment d'appartenance voulu, poussé, les demandes permanentes de réactivités, les réflexions accélérées par la pression des contraintes, vos responsables initiaux qui, de temps en temps, reviennent vers vous avec des problèmes du quotidien, etc, on peut vite culpabiliser, stresser et l'épuisement, physique et/ou psychologique, peut vite arriver. La pression est forte sur les projets. Il est important de prévoir des soupapes. C'est aussi ça le rôle de nos événements mais ce n'est pas toujours suffisant.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 5

Les effets négatifs des projets

©Le brouillage des identités professionnelles (déstabilisation des identités)

Le projet sort souvent l'individu du schéma classique de l'entreprise. Le succès d'un projet peut lui servir de tremplin professionnelle.

Sur un plateau, surtout quand on recourt à l'ingénierie concourante (IC), des salariés de différents fournisseurs tout comme vos salariés vont travailler ensemble. Même sans qu'ils ne parlent directement de leurs rémunérations ensemble, des différences de niveau de vie seront peut-être palpable, tout comme des flexibilités d'emploi du temps, des remboursements de frais, etc. Ici c'est le votre salarié qui pourrait ne voir que les avantages qu'ont ses nouveaux collègues.

Comme chef de projet, vous pourrez remonter cela à qui de droit. Comme manager au sein de l'organisation, vous avez intérêt à anticiper ces ressentis. Le risque de perdre un bon élément sera présent si vous ne réagissez pas assez vite.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 6

Les effets négatifs des projets

© Les déstabilisations des expertises (précarisation du parcours professionnel)

Nous pouvons illustrer cela de diverse manière.

Dans une équipe projet, nous avons souvent des experts du métier et de l'organisation. Ils ont appris à faire leur travail d'une certaine manière, ils ont peut-être même développés tout ou partie des méthodes et processus utilisés dans l'organisation. Ils ont un vécu et le processus s'est construit sur une suite d'événements, un historique. Il ne faut pas dénigrer cela!

Quand les experts projets arrivent, leur rôle est d'améliorer, d'optimiser ce processus. Ils vont l'analyser et pointer les incohérences. Mais c'est leur travail. Ils sont payés pour cela, ont un certain recul et ont le temps pour ces analyses. Cela ne signifie pas que vos experts du métier n'auraient pas été capables d'en faire autant dans les mêmes conditions. Vous devez bâtir vos optimisations avec les experts métier et les accompagner dans la mise en place des changements organisationnels. Vos experts métier resteront là après le projet. Ils seront les garants de la bonne exploitation de son résultat. Ne vous laissez pas paraître comme plus expert qu'eux sur le métier. Ce n'est d'ailleurs pas le cas.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 7

Les effets négatifs des projets

© Les déstabilisations des expertises (précarisation du parcours professionnel)

Pour conclure sur ce point, repensez à ce que vous avez appris de vos professeurs à l'école et de la manière dont vous avez appliqué cela dans le monde du travail. Il y aura toujours une différence entre la théorie et la pratique. Un très bon théoricien ne fera pas forcément un bon praticien. Car dans la pratique, il y a toujours une multitude de facteurs internes et externes avec lesquels il faut composer.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 8


Les limites du management de projet

© Les échecs


En management, l'efficacité s'évalue sur la capacité à atteindre des objectifs. En management de projet, l'efficacité se mesure donc tout naturellement en terme de qualité, de respect des budgets et des délais. Certains organismes émettent des rapports généralistes sur le sujet. C'est le case des rapports CHAOS du Standish Group (<https://www.standishgroup.com/>).

En 2015, le rapport CHAOS nous indiquait que seulement 44% des projets respectaient leur budget, 40% leur délai et 56% leur objectif.


CHAOS Report 2015, Standish Group.

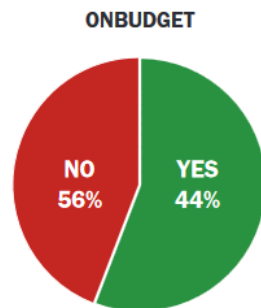

The percentage of projects that were OnBudget from FY2011-2015 within the new CHAOS database.

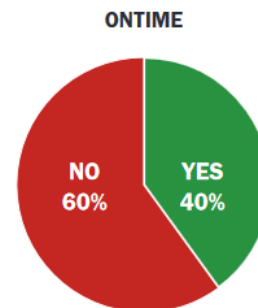

The percentage of projects that were OnTime from FY2011-2015 within the new CHAOS database.

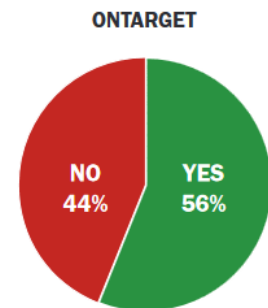

The percentage of projects that were OnTarget from FY2011-2015 within the new CHAOS database.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 9

Les limites du management de projet

©Les échecs

Dans son ouvrage, Gilles Garel, avance que selon Engwall (2002), on a identifié trois causes principales d'échec :

- Des défaillances du management (coordination, arbitrage, etc)
- Des facteurs environnementaux (perte de ressources, changement de législation, etc.)
- Des spécifications confuses, des variations d'objectifs

Cependant, certains projets, notamment quand il s'agit d'innovation ou de recherche, l'échec fait partie du processus. On tente plusieurs choses avant de faire des choix et ne garder que les plus prometteuses. De même, on ne peut se borner à respecter les coûts, les délais et fonctionnalités si on s'aperçoit en cours de route, pour x raisons, que le scope doit changer (si un changement de législation intervient, faut-il jeter 6 mois de travail ou alors s'adapter si possible?).

Il paraît alors difficile de juger de l'efficacité d'un projet uniquement sur les critères de fonctionnalité, qualité, coût et délai.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 10

Les limites du management de projet

©Les limites de l'innovation par projet

À la recherche de bonnes pratiques et de processus reproductible, les processus d'innovation se sont tout naturellement tournés vers le management de projet. Pourtant le diktat de la gestion, et donc de la gestion de projet, est toujours fort présent dans nos organisations. Si l'on parle souvent par exemple de gestion des risques et des opportunités. Il est rare que l'on travaille vraiment sur les opportunités probablement par crainte de ne pas tenir les objectifs de qualité, coût et délai, de partir dans l'inconnu et de perdre le contrôle. On mise alors plus sur la prudence. Peut-on alors vraiment innover en gestion de projet?

L'innovation peut être gérée comme une activité spécifique. Certaines organisations considèrent que le projet et l'innovation sont deux choses à part. Le projet se fixe des objectifs précis. La recherche est un processus contrôlé qui produit des connaissances et c'est le développement qui active ces connaissances pour définir un cahier des charges, fixer des coûts et des délais. Le management de projet ne s'applique alors qu'au développement. L'innovation et son management essaie de faire converger des concepts (développement) et des connaissances (recherche) pour renouveler l'offre de l'entreprise.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 11

Les limites du management de projet

©Les limites de l'innovation par projet

Parlons aussi des projets d'exploration.

Dans des organisations souvent plus matures, l'innovation est gérée par projet. Il s'agit cependant d'une innovation incrémentale et ciblée ex ante (au préalable <> ex post après). Il n'y a qu'ainsi que les objectifs de l'innovation peuvent rester sous contrôle du management de projet (c'est à dire sous contraintes de qualité, coût et délai). Notons que l'on ne peut donc manager ainsi des projets d'innovation radicale car les innovations radicales sont beaucoup trop incertaines et risquées.

Dans les projets d'exploration, le but n'est pas de renouveler directement l'offre de l'entreprise. L'acquisition de nouvelles connaissances, l'exploration de nouvelles technologies, de nouveaux concepts permet à l'entreprise de comprendre plus largement le monde qui l'entoure. Ces nouveaux savoirs ne sont au mieux que des demi-produits mais l'entreprise sera les exploiter où les ressortir du tiroir au moment opportun.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 12

Les renouvellements du management de projet

©Des perspectives

Apprendre à absorber les causes d'échecs pour la réussite du projet, trouver des pratiques plus adaptées à la recherche et l'innovation, il semble que le management de projet puisse encore évoluer et que tout n'est pas encore écrit. Les bases du management de projet ont été posées vers 1990 mais l'innovation ou encore le rethinking ont amené ce management à être repensé.

Nous avons déjà parlé un peu du MMP (Management MultiProjet)

C'est le management global de projets en tenant compte des interdépendances entre ces derniers. Ce peut être le management d'un portefeuille de projet (surtout Type C). Mais il peut s'agir aussi de management de projets d'entités (entreprises) ayant fusionnées (quand il faut trouver les convergences, les synergies, etc.) ou encore des projets partageant une plate-forme (un socle) commune (par exemple un châssis de voiture que l'on réutilise pour plusieurs modèles).

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 13

Les renouvellements du management de projet

©Des perspectives

Il y a aussi le management de projet et le management de la connaissance.

Initialement l'apprentissage s'est traduit par des exercices de REX. Des retours d'expériences matérialisés dans un document en fin de projet et archivés. Le but étant d'utiliser ces connaissances de manière diachronique (de projets à projets ultérieurs). Mais la connaissance peut-être utile de manière synchronique (de projet en cours à projet en cours). Cette connaissance peut être intermédier ou encore interentreprise. Elle se partage désormais aussi sur des forums, dans des groupes sur les réseaux sociaux, etc.

Finalement, on peut parler aussi du management de projet plus stratégique et plus organisationnel.

Les projets se sont déclinés. De la création de nouveaux produits ou services, nous sommes passés à une utilisation stratégique et organisationnelle du management de projet. Les projets servent à restructurer l'organisation des entreprises. On s'unit à des laboratoires ou encore à des universités pour développer des projets stratégiques. Le mode projet devient le mode d'action privilégié par le management et le management stratégique.

Mise à jour le 30.08.20 par Olivier Miniaïlo - diapo 14

*Merci de votre
attention*

